



NUMEROS GENERADORES

OBRA CASA HABITACION UBICADA EN 7 PRIVADA DE LA 6 ORIENTE, 605 LETRA A, COLONIA QUINTA GUADALUPE


CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ALTO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Zapata seccion 1.10 metros por 1.10 metros, peralte de 30 cm, armada con doble parrilla, parrilla inferior con varilla de 1/2" @ 15 cm y parrilla superior con varilla de 3/8" @ 20 cm. Dado de seccion 40x40 cm, armado con 7 varillas de 1/2", con estribo de alambreon @ 15 cm, a una altura de 1.20 metros posterior de la zapata. Columna con seccion 30 x 30 cm, armada con 4 varillas de 1/2" y 4 varillas de 3/8" con doble estribo de alambreon, a cada 15 cm, su altura se considera a nivel inferior de trabe		3 A-J	2			PIEZA	2	
		5 A-J	2					Se considera excavacion,
		9 A-J	2					mejoramiento del terreno a
		11 A-J	2					15 cm inferior de plantilla
								de concreto (proporcion 6-
								6-1), impermeabilizado y
					GRAN TOTAL		8	rellenado.
					PRECIO UNITARIO		\$6,500.00	
					COSTO TOTAL		\$52,000.00	

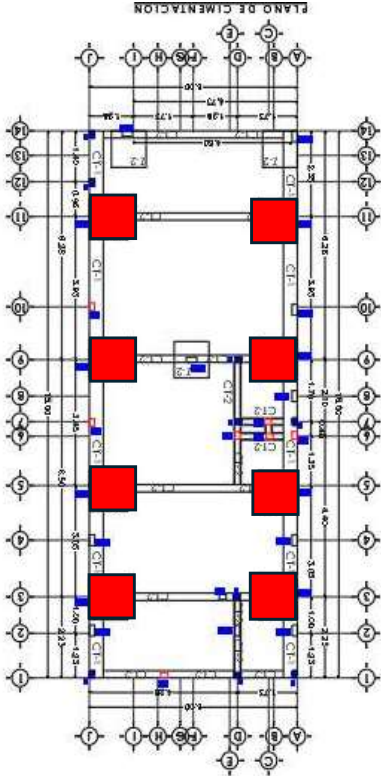


CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ALTO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Zapata seccion 1.0 metros por 1.0 metros, peralte de 20 cm, armada con una parilla inferior con varilla de 1/2" @ 15 cm Dado de seccion 40x25 cm, armado con 8 varillas de 1/2", con estribo de alambren @ 15 cm, a una altura de 1.20 metros posterior de la zapata. Columna con seccion 15 x 30 cm, armada con 4 varillas de 1/2" y 2 varillas de 3/8" con estribo de alambren @ 15 cm.	9 F		1			PIEZA	1	Se considera excavacion,
	14 A-F		2				2	mejoramiento del terreno a
								10 cm inferior de plantilla
								de concreto (proporcion 6-
							3	6-1), impermeabilizado y
					GRAN TOTAL		\$3,800.00	rellenado.
					PRECIO UNITARIO			
					COSTO TOTAL		\$11,400.00	

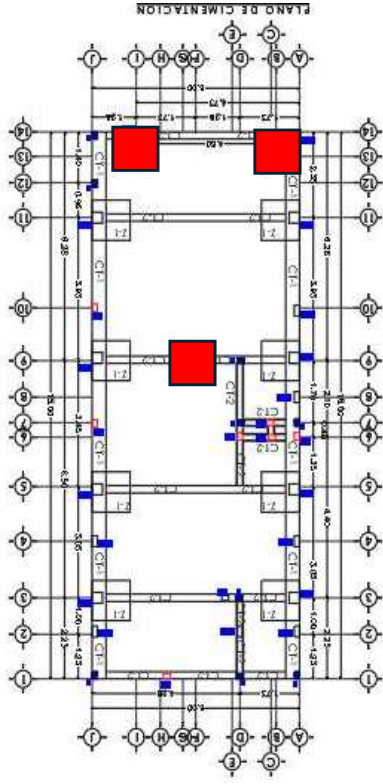

CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ALTO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Contratrabe armada con 11 varillas de 1/2, con seccion de 40-40 cm, con estribo de varilla de 3/8", a cada 12 cm a los extremos de cada claro y 15 cm al centro del claro.	A	1-14			15	ML	15	Se considera excavacion,
	J	1-14			15		15	mejoramiento del terreno a
								10 cm inferior de plantilla
					GRAN TOTAL		\$1,000.00	de concreto (proporcion 6-
					PRECIO UNITARIO		\$30,000.00	6-1), impermeabilizado a 2
					COSTO TOTAL			caras y rellenado.

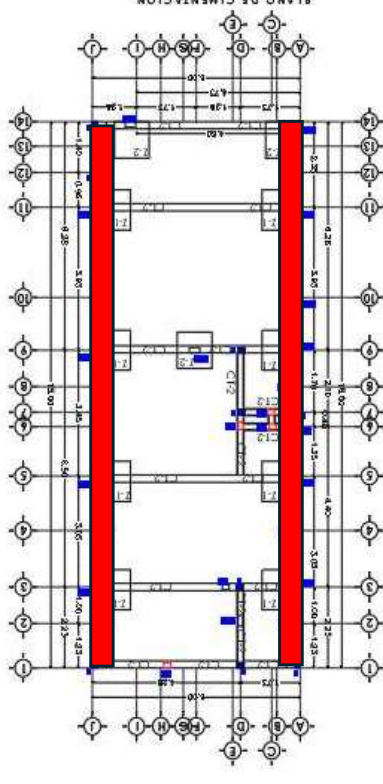


CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ALTO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Contratrabe de liga armada con 6 varillas de 1/2, con seccion de 20-40 cm, con estribo de alambreon, a cada 12 cm a los extremos de cada claro y 15 cm al centro del claro.		1 A-F			5.2	ML	5.2	
		3 A-F			5.2	ML	5.2	
		5 A-F			5.2	ML	5.2	
		9 A-F			5.2	ML	5.2	
		11 A-F			5.2	ML	5.2	
		14 A-F			5.2	ML	5.2	Se considera excavacion, mejoramiento del terreno a 10 cm inferior de plantilla de concreto (proporcion 6-1), impermeabilizado a 2 caras y relleno.
		D 1-3			1.925		1.925	
		D 5-9			3.32		3.32	
		6 A-D			1.22		1.22	
		7 A-D			1.22		1.22	
					GRAN TOTAL		38.885	
					PRECIO UNITARIO		\$380.00	
					COSTO TOTAL		\$14,776.30	

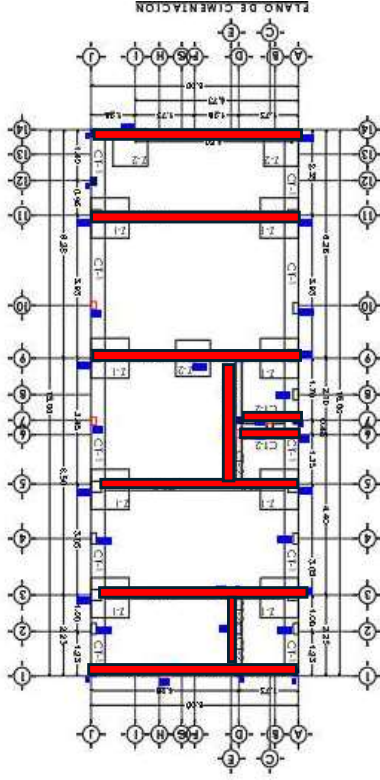



CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ALTO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Muro a base de tabique rojo recocido 7-14-28, asentado con cemento-cal-arena, proporcion 1-1-6, considerando altura libre de 2.77 metros (planta baja)	A	1-14			11.7	2.77 M2	32.409	
	D	1-3			1.7	2.77 M2	4.709	
	D	6-9			1.55	2.77 M2	2.3735	Se quita lo de la puerta y cadena de cerramiento
	J	1-14			12.2	2.77 M2	33.794	Se descuentaron anchos de castillos y columnas
	1	A-J			5.3	2.77 M2	14.681	
	3	D-F			0.2	2.77 M2	0.554	
	6	A-C			0.55	2.77 M2	1.5235	
	C	6-7			0.25	2.77 M2	0.6925	
	7	C-D			0.65	2.77 M2	1.8005	
	9	A-D			1.3	2.77 M2	2.561	Se quita lo de la puerta y cadena de cerramiento
	14	I-J			0.8	2.77 M2	2.216	

CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ALTO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Cadena de confinamiento a base de armex 15-20, colado a proporcion 1-4-5, utilizado para confinamiento de muros, vanos de puertas y ventanas o largos de claros de muros.	D	8-9			0.8	ML	0.8	
	9	A-D			2.6	ML		Se considero arriba y abajo de ventana
						GRAN TOTAL		
						PRECIO UNITARIO	\$110.00	
						COSTO TOTAL	\$374.00	

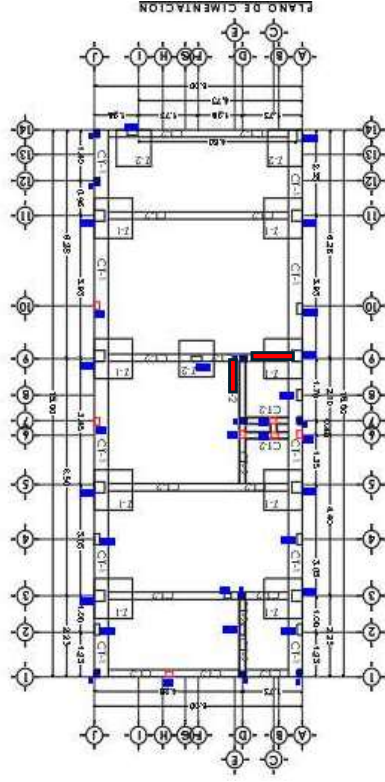


CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ALTO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Columna de seccion 15-30 cm terminada, armada con 4 varillas de 1/2" y 2 varillas de 3/8", con estribo de alambreon a cada 15 cm, colada con proporcion 1-4-5	A	1-14	4		2.77	ML	11.08	
	J	1-14	2		2.77	ML	5.54	Se considera una altura de 2.77 por que se cuenta del nivel superior de la contralabe y del nivel inferior de la losa
						GRAN TOTAL	16.62	
						PRECIO UNITARIO	\$380.00	
						COSTO TOTAL	\$6,315.60	

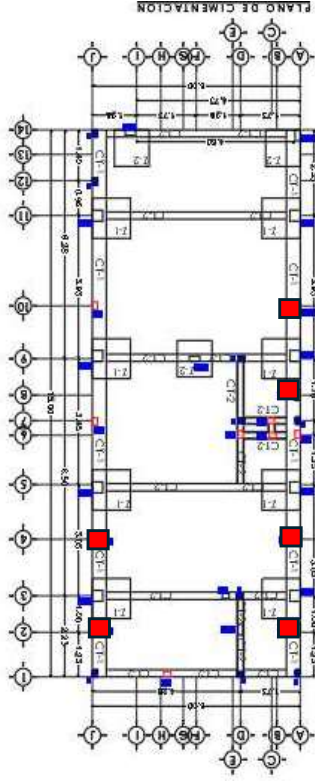





CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ALTO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Castillo armado con seccion 15-20 cm, habilitado con 4 varillas de 3/8" con estribo de alambren a cada 15 cm, colado con proporcion 1-4-5.	1	A-F	3		2.77	ML	8.31	
	3	D	1		2.77	ML	2.77	
	7	A-D	2		2.77	ML	5.54	Se considera una altura de 2.77 por que se cuenta del nivel superior de la contratrabe y del nivel inferior de la losa
	9	D	1		2.77	ML	2.77	
	J	12-14	2		2.77	ML	5.54	
					GRAN TOTAL		24.93	
					PRECIO UNITARIO		\$260.00	
					COSTO TOTAL		\$6,481.80	

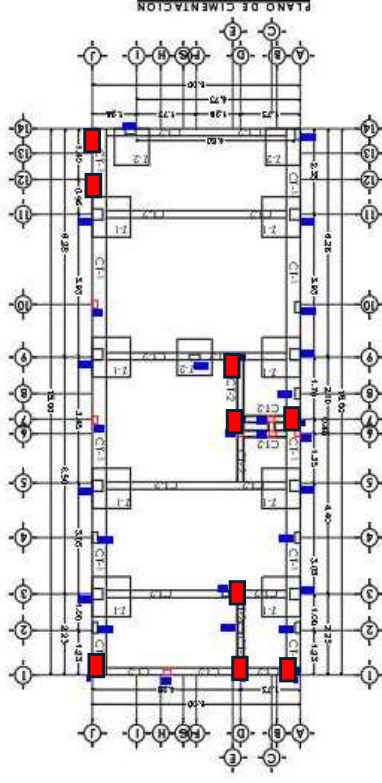


CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Firmes de concreto acabado rustico para recibir loseta de ceramica, con espesor no mayor a 7 cm, reforzado con malla electrosoldada 6-6-10, considerando mejoramiento de terreno y aplicacion de membrana por la parte inferior.	A-D	1-3			1.925	1.225 M2	2.358125	AL INTERIOR DE LA VIVIENDA SE CONSIDERA UN NIVEL SUPERIOR A LOS CONTRATRABES, POR LO CONSIGUIENTE SE
	D-J	1-3			3.775	1.925 M2	7.266875	CONSIDERA CORRIDO, SE
	A-J	3-9			5.7	6.725 M2	37.8525	DESCUENTA ANCHOS DE MUROS DE BAÑO, Y EN
	A-J	9-11			5.2	3.7	14.24	COCHERA EL NIVEL ES A RAZ DE CONTRATRABE,
	A-J	11-14			5.2	2.05	10.66	QUITANDO LOSA DE CISTERNA
					GRAN TOTAL		72.3775	
					PRECIO UNITARIO		\$115.00	
					COSTO TOTAL		\$8,323.41	

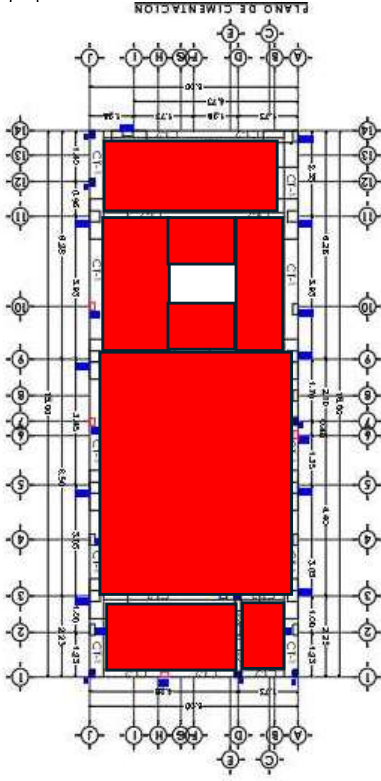


CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Trabe (T-1) de concreto armada con 8 varillas de 1/2" y estribo de alambren al inicio a cada 10 cm al centro a cada 15 cm y al final a cada 10 cm, su seccion es de 30-40 cm, considerando 20 cm por nivel inferior de losa.	3	A-J			6	ML	6	
	5	A-J			6	ML	6	
	9	A-J			6	ML	6	
	11	A-J			6	ML	6	Se considera la medida de extremo a extremo de terreno
								puesto que la pieza de columna se considero colada al nivel inferior de la trabe.
					GRAN TOTAL		24	
					PRECIO UNITARIO		\$550.00	
					COSTO TOTAL		\$13,200.00	

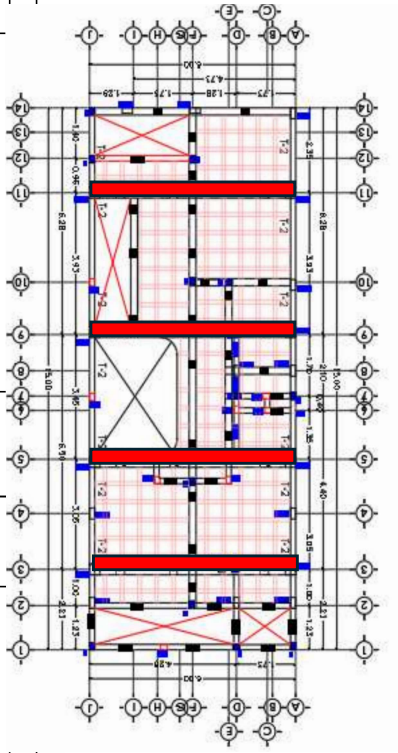

CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Trabe (T-2) de concreto armada con 4 varillas de 1/2" y 2 varillas de 3/8", estribo de alambren al inicio a cada 12 cm al centro a cada 15 cm y al final a cada 12 cm, su seccion es de 20-20 cm, considerando que esta ahogada sobre losa.	A	2-3			0.925	ML	0.925	
	A	3-5			2.675	ML	2.675	
	A	5-9			3.3	ML	3.3	
	A	9-11			3.55	ML	3.55	
	A	11-14			2.2	ML	2.2	
	J	2-3			0.925	ML	0.925	
	J	3-5			2.675	ML	2.675	
					GRAN TOTAL		16.25	
					PRECIO UNITARIO		\$380.00	
					COSTO TOTAL		\$6,175.00	

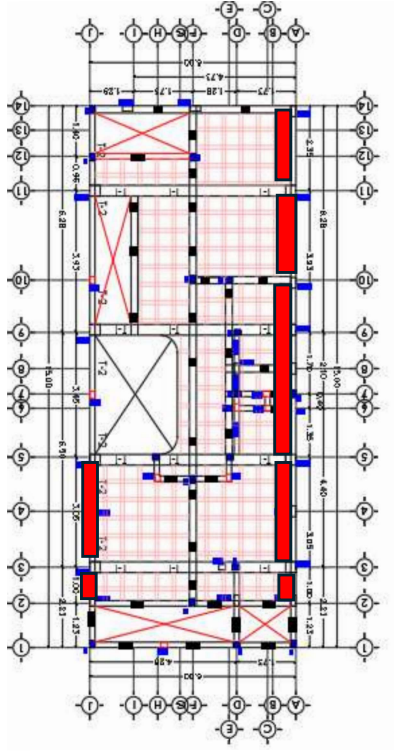


CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Trabe (T-3) de concreto armada con 4 varillas de 1/2" y 2 varillas de 3/8", estribo de alambren al inicio a cada 12 cm al centro a cada 15 cm y al final a cada 12 cm, su seccion es de 15-20 cm, considerando que esta ahogada sobre losa.	F	2-3			0.925	ML	0.925	
	F	3-5			2.675	ML	2.675	
	F	5-9			3.3	ML	3.3	
	F	9-11			3.55	ML	3.55	
	F	11-14			2.2	ML	2.2	
	J	5-9			3.3	ML	3.3	
	J	9-11			3.55	ML	3.55	
	J	11-12			0.88	ML	0.88	
	8	A-E			1.9	ML	1.9	
	10	A-E			2.95	ML	2.95	
	E	5-10			4.27	ML	4.27	
	14	A-J			5.55	ML	5.55	
	I	9-11			3.55	ML	3.55	
					GRAN TOTAL		38.6	
					PRECIO UNITARIO		\$380.00	
					COSTO TOTAL		\$14,668.00	

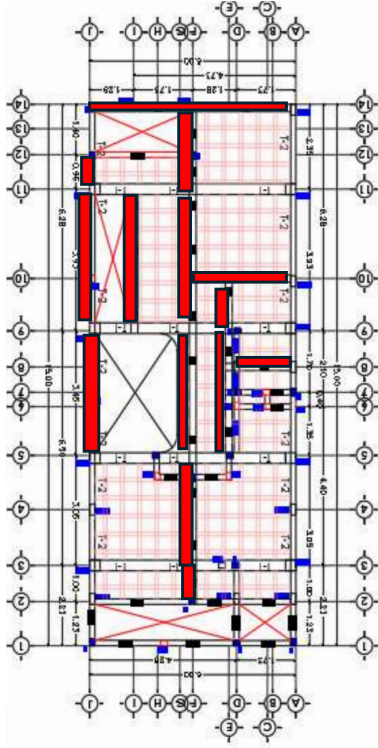


CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Cadenas de cerramiento con seccion 15-20 armada con 4 varillas de 3/8" con estribo de alambren a cada 15 cm, consideradas ahogadas sobre losa.	1	A-J			5.7	ML	5.7	
	2	A-J			5.7	ML	5.7	
	D	1-3			1.78	ML	1.78	
	5	E-H			2.25	ML	2.25	Cerramiento puertas
	6	A-D			1.65	ML	1.65	
	7	A-D			1.65	ML	1.65	
	D	6-9			2.85	ML	2.85	Se descuentan cadenas transversales
	12	F-J			2.75	ML	2.75	

J	1-2		1-2	1	ML	1	
A	1-2		1	1	ML	1	
E	4-5		0.25	0.25	ML	0.25	Cerramiento puertas
H	4-5		0.25	0.25	ML	0.25	Cerramiento puertas
J	12-14		1.12	1.12	ML	1.12	
				GRAN TOTAL		27.95	
				PRECIO UNITARIO		\$260.00	
				COSTO TOTAL		\$7,267.00	

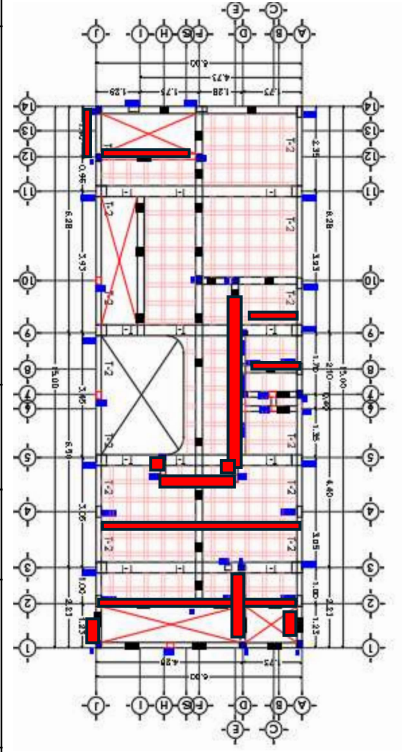

CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	UNIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
Losas en sistema artesonado con bloques de 40x40 cm, nervios armados con 2 varillas de 1/2 y refuerzo tipo s, al inicio, centro y final de cada bloque realizado de alambreon, se considera capa de compresion de 5 cm reforzada con malla electrosoldada para obtener un peralte final de 20 cm.	2-3	A-D			1.5	0.775	M2	1.1625
	2-3	D-F			1.1	0.775		0.8525
	2-3	F-J			2.75	0.775		2.13125
	3-5	A-F			2.75	2.67		7.1525
	3-5	F-J			2.75	2.67		7.1525
	5-6	A-D			1.5	1.2		1.8
	6-7	A-D			1.5	0.25		0.375
	7-8	A-D			1.5	0.52		0.78
	8-9	A-D			1.5	0.825		1.2375
	9-10	A-E			1.7	1.125		1.9125
	10-11	A-F			2.75	2.225		6.11875
	11-14	A-F			2.74	2		5.48
	5-9	E-F			3.3	0.85		2.805
	9-10	E-F			1.12	0.85		0.952
	5-9	F-G			3.3	0.35		1.155
	9-11	F-I			3.55	1.5		5.325
	11-12	F-J			0.73	2.75		2.0075
						GRAN TOTAL		48.3995
						PRECIO UNITARIO		\$400.00
						COSTO TOTAL		\$19,359.80

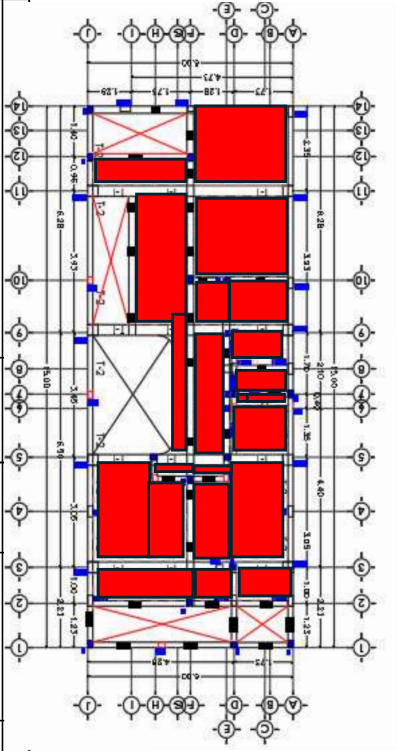

ANOTACIONES	CONCEPTO	
Sumatoria de todos los precios finales por concepto	TOTAL COSTOS POR CONCEPTO	\$211,268.17
Con pases hidráulicos, eléctricos y tapa metálica	CISTERNA	\$35,000.00
Anciada sobre muro lateral	ESCALERA FORIADA (DOBLE VISTA)	\$9,000.00
Drenaje interno	REGISTROS SANITARIOS 2 (60X40)	\$1,000.00
Conexión a drenaje público	REGISTRO SANITARIO 1 (60X60)	\$800.00
1 servicio coladera patio de servicio, 1 servicio lavadero, 1 servicio lavadora, 1 servicio tarja, 1 servicio w.c., 1 servicio lavabo, 1 servicio coladera medio baño, 1 servicio coladera cochera	INSTALACION SANITARIA (8 SERVICIOS)	\$0.00
1 Servicio calentador, 1 servicio lavadora, 1 servicio lavadero, 1servicio tarja, 1 servicio wc, 1 servicio lavabo, 1 servicio llave de servicio baño, 1 servicio llave de servicio cochera	INSTALACION HIDRAULICA (8 SERVICIOS)	\$0.00
Conforme al plano de instalación eléctrica lámparas	INSTALACION ELECTRICA PREPARACION DE LAMPARAS (20 SALIDAS)	\$0.00
Conforme al plano de instalación eléctrica contactos	INSTALACION ELECTRICA PREPARACION DE CONTACTOS (20 CONTACTOS)	\$0.00
Realizado sobre predio aledaño	MODULO SANITARIO	\$6,000.00
	GRAN TOTAL	\$263,068.17
